

恒基达鑫一二期装车站
新增两套卸车系统项目压力管道安装

交工资料

施工单位：贵州化工建设有限责任公司

编制： 王超

审核： 何安

日期：2021年4月10日

目 录

1. 压力管道安装质量证明书.....	1
附：压力管道汇总表	2
2. 特种设备安装改造维修告知书	3
附：业务办理资料接收回执.....	5
3. 管道元件检查记录.....	6
4. 阀门试验记录.....	7
5. 管道焊接检查记录.....	8
6. 管道安装记录.....	12
7. 管道支吊架的安装记录.....	13
8. 管道静电接地测试记录.....	14
9. 管道系统压力试验和泄漏性试验记录.....	15
10. 管道系统吹扫与清洗检查记录.....	16
11. 管道防腐施工及验收记录.....	17
12. 管道防腐分项工程质量验收记录.....	18
13. 管道单线图.....	19

附件：1、压力管道设计、安装、无损检测许可证；焊接人员作业证；压力管道元件制造许可证

2、管材、管件、焊材、油漆产品质量证明书

3、施工方案

4、焊接工艺评定

5、X 射线检测报告

6、设计图纸

压力管道安装质量证明

一、压力管道质量证明书

编号：2021-04-01

工程名称	珠海恒基达鑫一二期装车 站新增两套卸车系统项目	工程编号	
交工单元名称	压力管道安装	交工单元编号	
安装开工日期	2021.3.24	安装竣工日期	2021.3.4.3
管道级别	GC2	管道长度	200 米
设计单位	广东星燃石化设计院有限公司		
监理单位			
无损检测单位	南京金鑫检测工程有限责任公司		
安装监检单位	广东省特种设备检测研究院珠海检测院		
使用单位	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司		

本压力管道的安装经质量检验，符合《压力管道安全技术监察规程》、设计文件的要求。

附：《压力管道安装汇总表》共 1 页

检验员：王超 日期：2021.4.3

质量保证工程师：[Signature] 日期：2021.4.3

安装单位（盖章）

2021 年 4 月 3 日

特种设备安装许可证编号：TS3810436-2021

特种设备安装改造维修告知书

施工单位: _____ (加盖公章) 告知书编号: _____

设备施工情况					
施工类别	在相应“□”打“√”: ☒ 安装 (☐ 移装) ☐ 改造 ☐ 维修				
设备名称(台数): 化工品(丙醇) DN100 2条, 共 200 米 管道设计单位全称: 广东星燃石化设计院有限公司 管道设计许可证编号: TS1810648-2021 设备出厂编号: PL8303-100, PL8306-100					
施工单位全称	贵州化工建设有限责任公司			告知日期	2021. 3. 18
施工地点	珠海恒基达鑫库区内			施工日期	2021. 3. 14
许可证编号	TS3810436-2021		许可证有效期	2021. 4. 27	
联系人	肖中升	固定电话		传 真	
		移动电话	13902530198		
地 址	高栏沙白石村 8 号			邮 编	
使用单位全称	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司				
联 系 人	李玉廷	电 话	13570608772	传 真	
地 址	珠海市高栏港经济区南迳湾			邮 编	
监察机构接收情况: 告知查询号:					

特种设备许可证范围内的多台承压类特种设备可采用本文书+附表(加盖施工单位公章和骑缝章)

特种设备业务办理资料接收回执

查询号: 2021032323979

回执号: 440405 特 W26020210088

施工类别	安装	申报人	李玉廷			
建设单位	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	组织机构代码	78510822X			
施工单位	贵州化工建设有限责任公司	施工单位代码	91520000214400296G			
施工现场地址 珠海市金湾区南水镇南边湾恒基达鑫库区						
设备情况	序号	设备种类	设备级别	型号	出厂编号	单位内部编码
	1	压力管道	GC2	化工品 (丙醇)		一、二期新增卸车站
办理承诺	你单位该工程施工告知书, 已送达我局, 根据《特种设备安全监察条例》规定, 该工程即可开始施工。若该告知书存在不符合有关规定的问题, 我局将在___个工作日内向你单位书面说明原因和处理意见。					

咨询电话: ___ 地址: 广东省珠海市香洲区人民西路 133 号
 查询网址: ___

表A. 0.5管道焊接检查记录

工程编号:		工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目				分项工程名称/ 编号: 压力管道焊接							
管线路号: PL8306-100						无损检测方法: RT			无损检测比例: 10%				
焊缝 编号	接头 类型	管道 材质	管道 规格	固定或 转动	焊接方法	焊接材料 牌号/规格	预热 温度	层间 温度	后热温度/ 时间	焊工姓名/ 代号	施焊 日期	外观质量 检查结果	无损检 测结果
1	角焊	20	φ 57*3.5	转动	SMAW	E4303/ φ 3.2	/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
2	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW	JL-J50/ φ 2.0 E4303/ φ 3.2	/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
3	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
4	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
5	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
6	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
7	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
8	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.24	合格	/
9	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
10	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
A	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	合格
12	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
13	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
14	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
15	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
16	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
17	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.25	合格	/
18	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
19	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
20	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
专业工程师: 尚琴		质量检查员: 王超					记录人: 王超				2021年4月1日		

表A.0.5管道焊接检查记录

工程编号：		工程名称：恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目				分项工程名称/编号：压力管道焊接							
管线路号：PL8306						无损检测方法：RT			无损检测比例：10%				
焊缝编号	接头类型	管道材质	管道规格	固定或转动	焊接方法	焊接材料牌号/规格	预热温度	层间温度	后热温度/时间	焊工姓名/代号	施焊日期	外观质量检查结果	无损检测结果
21	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW	JL-J50/φ 2.0 E4303/φ 3.2	/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
22	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
23	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
24	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.26	合格	/
25	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	/
26	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	/
27	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	/
28	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	/
29	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	/
B	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	合格
C	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.27	合格	合格
D	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.28	合格	合格
33	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.28	合格	/
34	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.28	合格	/
E	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.28	合格	合格
36	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	赵传辉/Z2	2021.3.28	合格	/

专业工程师：尚海

质量检查员：王超

记录人：王超

2021年4月1日

表A. 0.5管道焊接检查记录

工程编号:		工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目				分项工程名称/编号: 压力管道焊接							
管线路号: PL8303-100		无损检测方法: RT				无损检测比例: 10%							
焊缝编号	接头类型	管道材质	管道规格	固定或转动	焊接方法	焊接材料 牌号/规格	预热 温度	层间 温度	后热温度/ 时间	焊工姓名/ 代号	施焊 日期	外观质量 检查结果	无损检测 结果
1	角焊	20	φ57*3.5	转动	SMAW	E4303/φ3.2	/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
2	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW	JL-J50/φ2.0 E4303/φ3.2	/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
3	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
4	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
5	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
6	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
7	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
8	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
9	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.24	合格	/
10	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
11	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
12	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
A	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	合格
14	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
15	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
16	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
17	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.25	合格	/
18	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
19	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
20	对焊	20	φ108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
21	对焊	20	φ108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/

专业工程师: 尚琴

质量检查员: 王超

记录人: 廖柏鑫

2021年4月1日

表A. 0.5管道焊接检查记录

工程编号:		工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目				分项工程名称/编号: 压力管道焊接							
管线路号: PL8303						无损检测方法: RT				无损检测比例: 10%			
焊缝编号	接头类型	管道材质	管道规格	固定或转动	焊接方法	焊接材料牌号/规格	预热温度	层间温度	后热温度/时间	焊工姓名/代号	施焊日期	外观质量检查结果	无损检测结果
22	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW	JL-J50/φ 2.0 E4303/φ 3.2	/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
23	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
24	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.26	合格	/
25	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
26	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
27	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
28	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
29	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
30	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
31	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
32	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
33	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
34	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.27	合格	/
B	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	合格
C	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	合格
D	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	合格
38	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	/
39	对焊	20	φ 108*5	固定	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	/
E	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	合格
41	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW		/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	/
42	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW	/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	/	
43	对焊	20	φ 108*5	转动	GTAW/SMAW	/	/	/	廖柏鑫/L1	2021.3.28	合格	/	
专业工程师: 尚琴		质量检查员: 王超				记录人: 王超				2021年4月1日			

13+24=27

表A.0.10管道静电接地测试记录

[illegible]

A. 0. 16管道系统压力试验和泄漏性试验记录

工程编号: /		工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目												
试压前检查内容														
管道组件安装完毕、正确														
法兰、阀门、螺栓、垫片安装正确														
支、吊架安装正确														
焊缝、焊接工作记录齐全														
焊缝外观检查合格														
无损检测合格														
热处理合格														
安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下加以隔离														
有盲板标识														
序号	管径号	管道等级	设计参数			起点	终点	压力试验			泄漏性试验			
			压力	温度	介质			压力	介质	结论	压力	介质	结论	
1	PL8303-100	M1B	0.55Mpa	50°C	化工品	P8301A	四区交换站	0.825Mpa	洁净水	合格	0.55Mpa	空气	合格	
2	PL8306-100	M1B	0.55Mpa	50°C	化工品	P8301B	四区交换站	0.825Mpa	洁净水	合格	0.55Mpa	空气	合格	
监检单位: 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 主管工程师: 建设单位: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 主管工程师: 李玉林 施工单位: 贵州化工建设有限责任公司 技术负责人: 孙少 试验人员: 邓祥														
2021年 4 月 2 日			2021年 4 月 2 日			2021年 4 月 2 日			2021年 4 月 2 日			2021年 4 月 2 日		


A.0.17 管道系统吹扫与清洗检查记录


[illegible]

管道防腐施工及验收记录

工程名称	恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目				施工单位	贵州化工建设有限责任公司		
分部工程	压力管道安装				施工日期	2021.3.18~2021.4.3		
分项工程	压力管道防腐							
	基层表面处理		隔离层		防腐面层		质量评定	
管线号	处理方法	检查结果 (等级)	名称	层数或厚度	检验结果	名称	层数或厚度	检验结果
PL8303-100	喷砂除锈	St3.0级	环氧富锌底漆	二层/80 μm	合格	丙烯酸聚氨酯面漆	二层/80 μm	合格
PL8306-100	喷砂除锈	St3.0级	环氧富锌底漆	二层/80 μm	合格	丙烯酸聚氨酯面漆	二层/80 μm	合格
监理工程师:	技术负责人:		质检员:		施工日期:		施工人员:	

管道防腐分项 工程质量验收记录

分项工程名称	压力管道防腐				
施工单位	贵州化工建设有限责任公司	项目负责人		项目技术负责人	
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包单位技术负责人	/
序号	检验项目	施工单位检验结果			
1	油漆品种、牌号、质保书	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
2	涂料的品种、质量与质量必须符合质量要求和国家规范规定。	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
3	严禁脱皮、起泡、误涂、漏涂	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
4	涂层应完整、无漏涂和损坏、漆膜附着牢固。	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
5	漆膜应均匀、色泽一致、无流淌及污。	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
6	色环、工作介质与流向等标记清晰整齐。	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
7	防腐层应整齐、无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
8	剥落、开裂、皱纹、气孔	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
9	脱皮、起泡、漏涂、损坏	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
10	干漆膜总厚度	合格		☐ 合格 ☐ 不合格	
质量控制资料		符合		☐ 符合 ☐ 不符合	
施工单位质量检查员:  施工单位专业技术负责人:  2021年 4 月 3 日		监理（建设）单位验收结论: 监理（建设）单位专业技术负责人:  2021年 4 月 3 日			

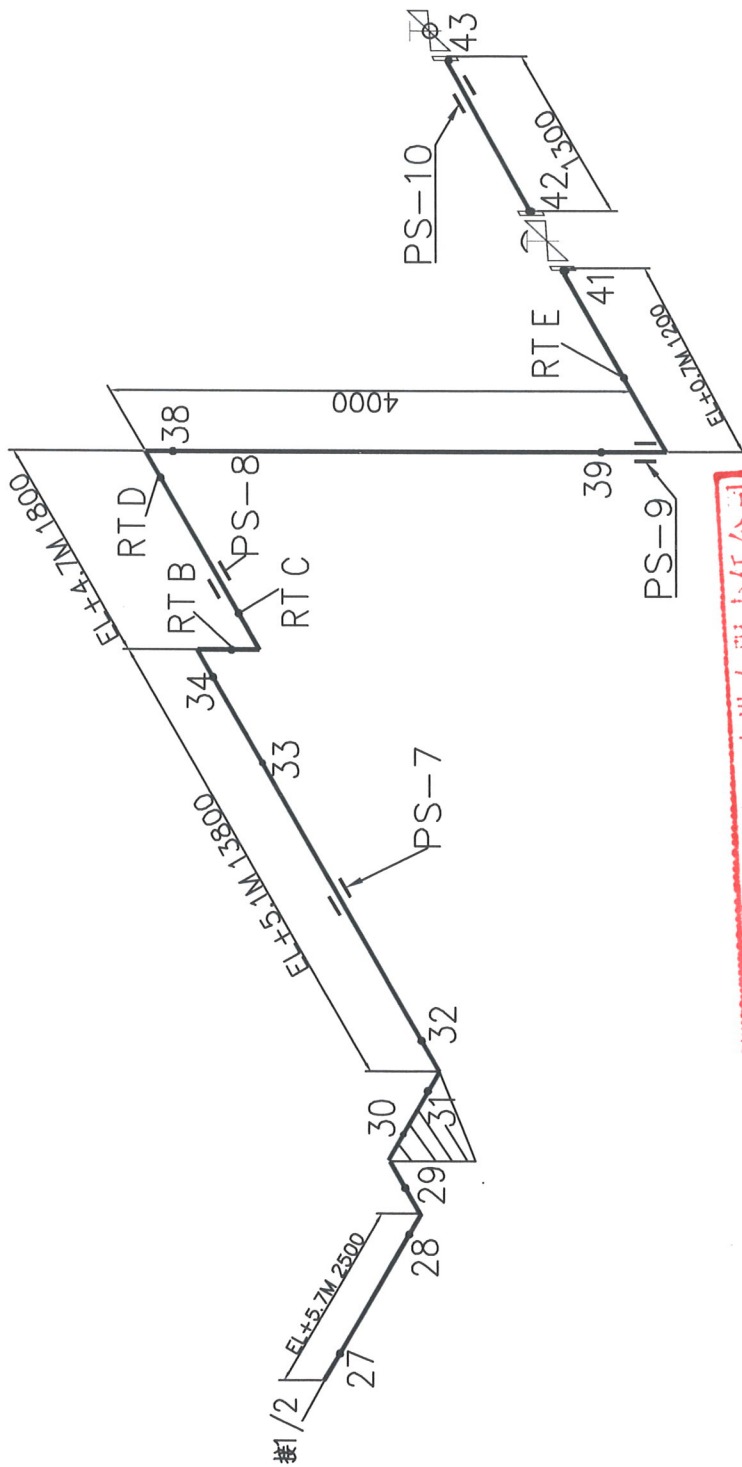


施工单位 贵州化工建设有限责任公司

竣工图

编制人	技术负责人	编制日期
陈	王	2021.4.3
监理单位	单位名称	监理单位
陈	王	王

贵州化工建设有限责任公司

设计压力(MPa)	设计温度(°C)	设计压力(MPa)	设计温度(°C)	设计压力(MPa)	设计温度(°C)	设计压力(MPa)	设计温度(°C)
0.5	常温	0.55	50	0.825	水	20	25
贵州化工建设有限责任公司				工程名称	设计名称	设计名称	设计名称
PL8303-100				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
管道检测图				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
GC2				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
专业				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
工艺				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
比例				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
入册日期				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称
第2页, 共2页				设计名称	设计名称	设计名称	设计名称

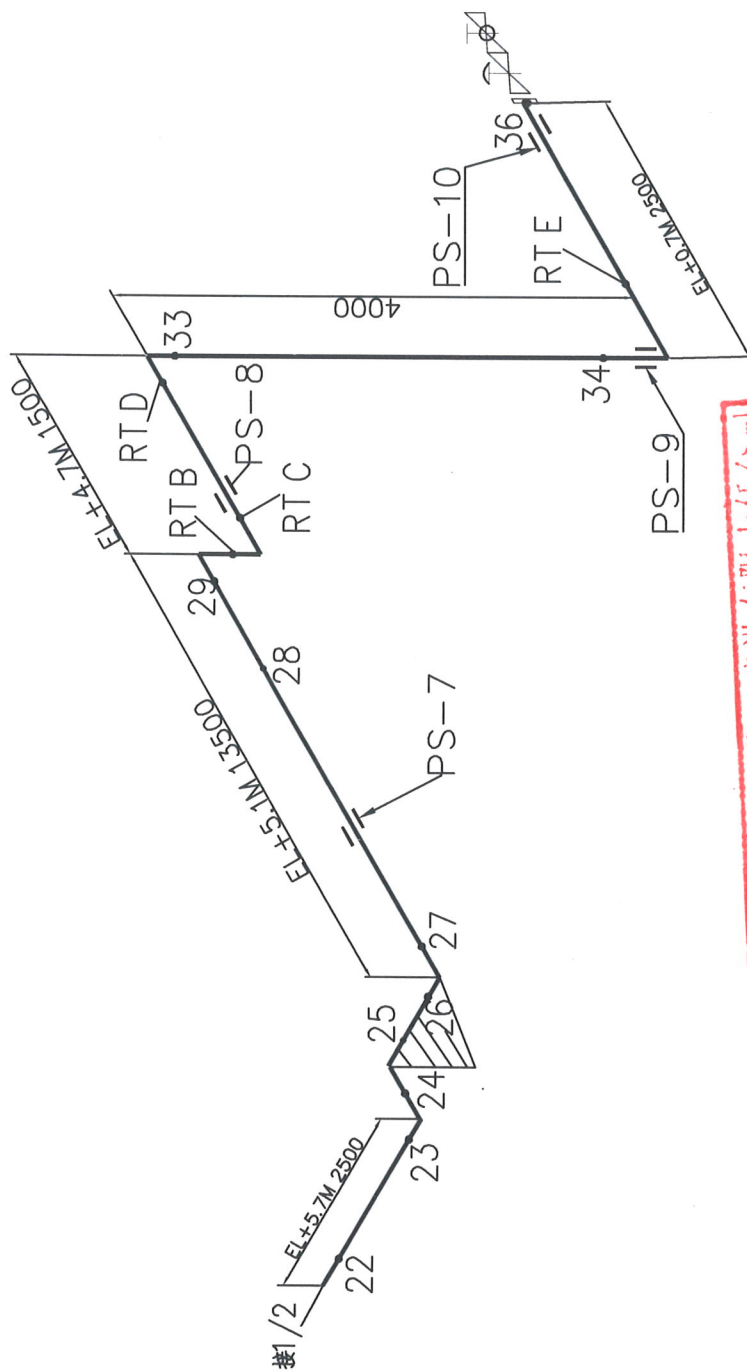

施工单位	贵州化工建设有限责任公司
-竣工图-	
编制人	技术负责人
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
监理单位	单位名称
<i>[Signature]</i>	称
编制日期	监理人
2011.6.5	
抚顺诚信石化工程项目管理有限公司	

[illegible]
